




Narodowy Plan
Rozwoju 2004-2006

**Informacja
o stanie realizacji programów operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
za okres od 1 do 31 sierpnia 2007 r.**

I. Informacja o wykorzystaniu funduszy strukturalnych w Polsce

W sierpniu 2007 r. beneficjenci programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE otrzymali tytułem refundacji ponad 978,7 mln zł z kont programowych. Tym samym kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów wzrosła do poziomu 17,77 mld zł, co stanowi 54,3% alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006. Jednocześnie strona polska certyfikowała do Komisji Europejskiej w sierpniu 2007 r. wydatki o wartości 126 mln euro. Łącznie od początku uruchomienia programów operacyjnych 2004-2006 skierowano do KE wnioski o refundację na kwotę 3,74 mld euro (43,5% alokacji).

Wykres 1. Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004 - 2006 wg stanu na koniec sierpnia 2007 r. (zastosowany kurs: 1 euro = 3,8096 PLN)¹.

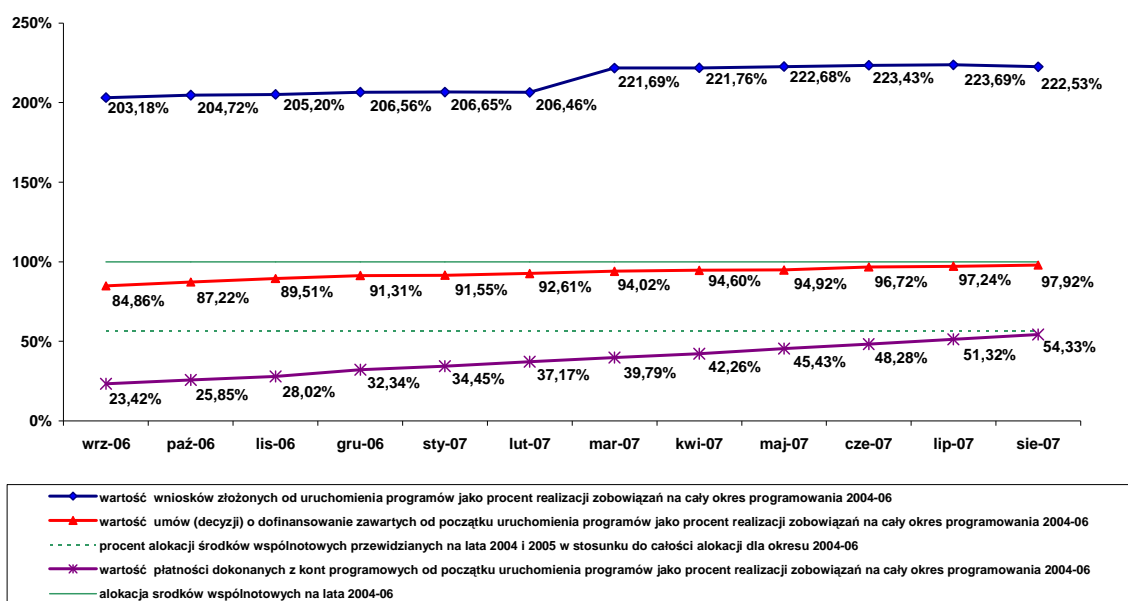


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających PO.

Według stanu na koniec sierpnia 2007 r. wartość poprawnych formalnie wniosków złożonych przez beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2004-2006 wyniosła 72,8 mld zł, co stanowi 222,5% alokacji na lata 2004-2006. Nabór wniosków ma w dalszym ciągu miejsce w działaniach, w których pozostały jeszcze środki do zakontraktowania. Jednakże większość działań cechuje wysoka łączna wartość wniosków złożonych od początku uruchomienia programów 2004-2006, znacznie przekraczająca dostępną alokację środków z funduszy strukturalnych przyznanych dla danego działania. Jedynie w 15 działaniach na ok. 100 realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wartość wniosków nie przekroczyła jeszcze 100% dostępnej alokacji (z czego 8 działań tego typu jest realizowanych w ramach SPO *Rybołówstwo i przetwórstwo ryb*). Wnioski złożone w sierpniu 2007 r. w 18 działaniach programów operacyjnych opiewają na kwotę 84,8 mln zł w części dofinansowania UE.

¹ Wartości procentowe różnią się od danych przedstawionych w *Informacji...* za okres od 1 do 31 lipca 2007 r. z uwagi na zmianę kursu euro względem złotego.

Wykres 2. Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006, wg stanu na koniec sierpnia 2007 r. (zastosowany kurs: 1 euro = 3,8096 PLN).

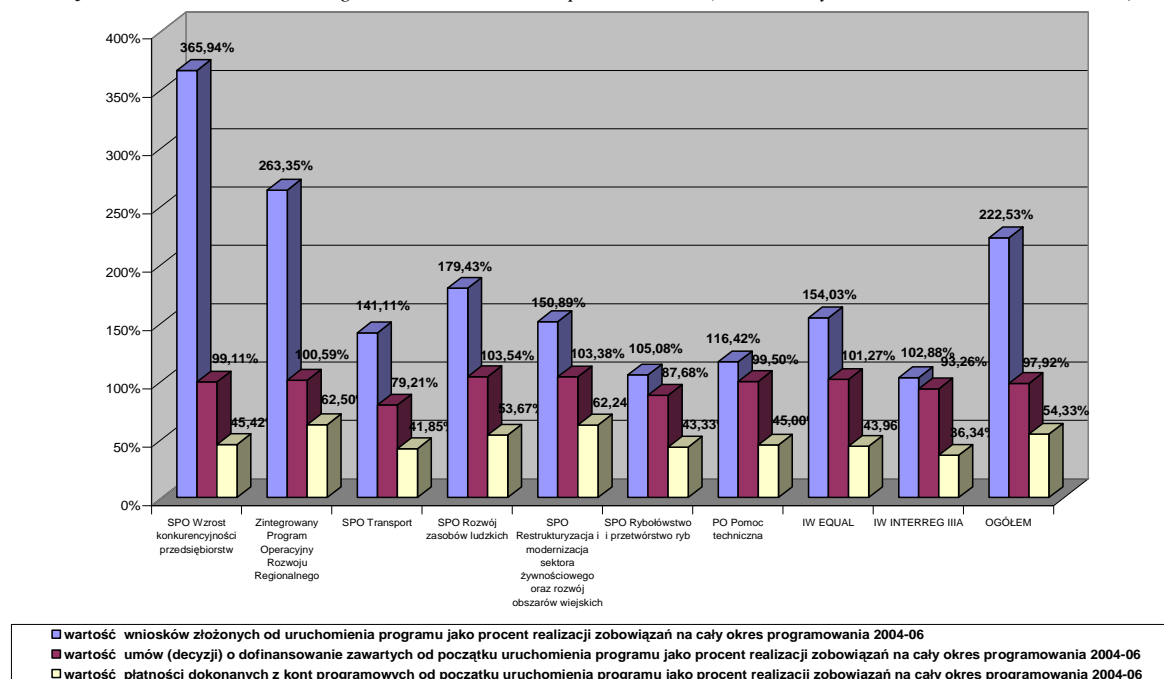

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających PO

W sierpniu 2007 r. podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych UE o wartości ponad 259 mln zł. Tym samym łączna kwota środków zakontraktowanych wzrosła na końca sierpnia 2007 r. do poziomu ponad 32 mld zł, co stanowi 97,9% alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006. Według stanu na koniec sierpnia 2007 r. już w 75 działaniach na ok. 100 realizowanych w ramach wszystkich programów operacyjnych NPR 2004-2006 zakontraktowano ponad 90% środków dostępnych dla poszczególnych działań, w tym w 56 działaniach ponad 100% (w działaniach, w których wartość podpisanych umów jest wyższa niż dostępna alokacja, dodatkowe projekty będą finansowane z oszczędności, które powstaną w trakcie realizacji programów operacyjnych).

Najwięcej działań o wartości podpisanych umów przekraczającej 100% dostępnej alokacji jest realizowanych w ramach *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego* – 13 tego typu działań, w ramach *PO Pomoc techniczna* – 10 działań, w ramach *SPO Rozwój zasobów ludzkich* – 9 działań oraz w ramach *SPO Restrukturyzacja...* - 7 działań. Najniższy poziom kontraktacji środków utrzymuje się w dalszym ciągu w ramach dwóch programów, tj. *SPO Transport* oraz *SPO Rybołówstwo...*, gdzie wartość podpisanych umów wynosi odpowiednio 79,2% oraz 87,7% alokacji.

Należy zauważyć, iż w przypadku *SPO Transport* wymieniony poziom kontraktacji jest wynikiem oczekiwania na wydanie przez Komisję Europejską decyzji o zatwierdzeniu 2 projektów mających status tzw. dużych projektów w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego², a także uruchomionego dopiero 27 sierpnia 2007 r. ponownego naboru

² Według art. 25 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1260/1999 za duży projekt uważa się: „niepodzielne zadanie o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, które posiada jasno określone cele i którego całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin”.

wniosków w działaniu 1.3 *Rozwój systemów intermodalnych*. W przypadku SPO *Rybołówstwo...* odnotowany poziom kontraktacji jest natomiast wynikiem relatywnie niskiego poziomu wnioskowanego wsparcia.

Od początku realizacji programów operacyjnych do końca sierpnia 2007 r. beneficjenci otrzymali z funduszy strukturalnych - przyznanych Polsce na lata 2004-2006 - refundacje o wartości blisko 17,8 mld zł, czyli 54,3% dostępnej alokacji. W samym sierpniu 2007 r. wartość płatności wzrosła o 978,7 mln zł. Według stanu na koniec sierpnia 2007 r. największych refundacji na rzecz beneficjentów z kont programowych - wykorzystujących ponad 50% alokacji – dokonano w ramach trzech programów: ZPORR (62,5% dostępnej alokacji), SPO *Restrukturyzacja...* (62,2% alokacji) oraz SPO RZL (53,7%). Najniższy poziom płatności - poniżej 40% alokacji - miał miejsce na koniec sierpnia 2007 r. w ramach IW *Interreg IIIA* (36,3%).

Tabela 1. Ilość i wartość wniosków o refundację przekazanych przez instytucję płatniczą do KE w ramach poszczególnych programów wg stanu na koniec sierpnia 2007 r. (wartość w euro)

Program	Ilość złożonych wniosków		Wartość złożonych wniosków (w EUR)		Wartość złożonych wniosków jako % zobowiązań na lata 2004-06	Wartość zaliczki przekazanej przez KE na konto programu	Wartość refundacji z KE	
	ogółem	sierpień 2007 r.	ogółem	sierpień 2007 r.			ogółem	sierpień 2007 r.
ZPORR	13	0	1 329 600 205	0	52,55%	404 800 197	1 329 596 542	73 805 469
SPO WKP	13	1	426 682 482	41 968 355	34,10%	200 175 747	375 768 080	0
SPO Transport	12	0	327 542 425	0	28,15%	186 141 514	327 163 429	68 342 631
PO PT	14	0	12 057 507	0	42,60%	4 528 714	12 057 507	1 191 818
Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia	6	0	6 037 460	0	20,16%	0	2 958 229	0
Polska / Kraj Związkowy Brandenburgia	5	0	8 951 827	0	29,79%	0	8 951 781	0
Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Województwo Dolnośląskie	10	0	5 959 767	0	22,40%	0	5 704 188	1 200 096
Polska - Republika Słowacka	8	1	8 218 131	1 190 679	78,26%	1 760 151	7 027 452	1 636 100
Republika Czeska - Polska	4	0	4 508 770	0	25,04%	2 880 471	2 732 453	0
Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Fed. Rosyjskiej	2	0	2 667 154	0	11,04%	2 630 242	2 667 154	0
Polska-Białoruś-Ukraina	8	0	12 163 021	0	32,16%	6 051 019	12 163 021	0

Program	Ilość złożonych wniosków		Wartość złożonych wniosków (w EUR)		Wartość złożonych wniosków jako % zobowiązań na lata 2004-06	Wartość zaliczki przekazanej przez KE na konto programu	Wartość refundacji z KE	
	ogółem	sierpień 2007 r.	ogółem	sierpień 2007 r.			ogółem	sierpień 2007 r.
Łącznie IW Interreg	43	1	48 506 130	1 190 679	27,39%	13 321 883	42 204 277	2 836 196
Łącznie ERDF	95	2	2 144 388 749	43 159 034	41,64%	808 968 055	2 086 789 835	146 176 113
ZPORR*	13	1	145 840 527	26 578 509	33,26%	70 155 126	86 412 740	0
SPO RZL	12	1	649 707 711	0	44,20%	235 205 315	553 810 915	0
IW Equal	11	0	45 734 437	0	34,15%	21 430 113	37 444 632	0
Łącznie ESF	36	1	841 282 675	26 578 509	41,19%	326 790 554	677 668 287	0
SPO ROLNY	16	2	685 840 857	56 347 568	57,50%	190 830 278	624 088 875	35 734 079
Łącznie EAGGF	16	2	685 840 857	56 347 568	57,50%	190 830 278	624 088 875	35 734 079
SPO RYBY	6	0	66 532 875	0	32,96%	32 293 130	59 290 587	0
Łącznie FIG	6	0	66 532 875	0	32,96%	32 293 130	59 290 587	0
Ogółem	153	5	3 738 045 158	126 085 111	43,53%	1 358 882 017	3 447 837 584	181 910 192

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji płatniczej.

W sierpniu 2007 r. strona polska przekazała do Komisji Europejskiej 5 wniosków o refundację na kwotę ponad 126 mln euro (w tym 2 w ramach EFRR, 2 w ramach EFOiGR oraz 1 w ramach EFS). Tym samym łączna wartość wniosków o płatności pośrednie skierowanych do Komisji Europejskiej wzrosła do poziomu ponad 3,7 mld euro, co stanowi 43,53% alokacji dla Polski na lata 2004-2006. Według stanu na koniec sierpnia 2007 r. strona polska otrzymała z KE tytułem płatności pośrednich blisko 3,45 mld euro, co stanowi 38,9% dostępnej alokacji. Kwota środków zrefundowanych przez KE (w ramach dwóch funduszy: EFRR oraz EFOiGR) w sierpniu 2007 r. wyniosła 181,9 mln euro.

II. Analiza realizacji zobowiązań w kontekście zasady n+2, postęp finansowy w 2007 r. oraz realizacja prognozy Rady Ministrów

A. Analiza realizacji zobowiązań w kontekście zasady n + 2 wg programów/priorytetów

Zgodnie z zasadą n+2, wymagany poziom wydatków certyfikowanych do KE do końca 2007 r. w skali wszystkich programów operacyjnych (bądź funduszy w przypadku ZPORR) powinien wynieść co najmniej 41% alokacji na okres programowania 2004 – 2006 (alokacja 2004 – 2005 czyli 57% alokacji 2004 – 2006 pomniejszona o płatność zaliczkową w wysokości 16% alokacji 2004 - 2006). Wskazane jest jednak osiągnięcie w 2007 r. znacznie wyższego poziomu wydatków certyfikowanych do KE, tak aby zapewnić odpowiedni poziom absorpcji środków wspólnotowych w 2008 r. W tym roku bowiem spodziewane są znaczne wydatki z funduszy strukturalnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013.

Poziom wydatków certyfikowanych do KE wynika bezpośrednio z poziomu płatności z funduszy strukturalnych, a zatem niezbędne jest osiągnięcie jak największego poziomu tych płatności.

Poniższa tabela przedstawia poziom płatności z funduszy strukturalnych w rozbiciu na poszczególne priorytety programów operacyjnych.

Tabela 2. Wartość płatności z funduszy strukturalnych od uruchomienia programu (stan na koniec sierpnia 2007 r.) jako % zobowiązań KE na cały okres programowania

Programy operacyjne	Priorytet	Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie	Wartość dokonanych płatności od uruchomienia programu (PLN)	Wartość dokonanych płatności w SIERPNIU 2007 r. (PLN) ³	Wartość dokonanych płatności od uruchomienia programu jako % realizacji zobowiązań na 2004 - 2006
1	2	3	4		6
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	1	MRR, MG, PARP, MNiSW, ARP	940 200 748	24 589 928	48,5%
	2	MRR, MG, PARP, NFOŚiGW, MŚ	1 180 806 772	74 228 379	42,9%
	3	MRR	43 612 522	6 972	56,4%
	OGÓLEM			2 164 620 042	98 825 279
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	1	MRR, wojew., urz. marszał.	4 216 624 339	251 676 986	62,8%
	2	MRR, wojew., urz. marszał., WUP-y, PUP-y	671 741 553	62 822 871	40,2%
	3	MRR, wojew.	2 130 312 319	59 273 340	76,9%
	4	MRR	49 226 820	1 451 450	32,4%
	OGÓLEM			7 067 905 031	375 224 647
Transport	1	MRR/MT	664 577 433	68 189 360	36,8%
	2	MRR/MT	1 183 395 918	127 018 795	45,7%
	3	MRR/MT	6 672 474	1 128 371	19,5%
	OGÓLEM			1 854 645 825	196 336 527
Rozwój zasobów ludzkich	1	MRR/MPiPS, WUP-y, PFRON	1 819 222 020	142 374 416	68,6%
	2	MRR, MEN, PARP, KPRM	1 142 760 996	55 363 106	40,5%
	3	MRR/MPiPS	43 795 527	576 248	35,2%
	OGÓLEM			3 005 778 543	198 313 770
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1	MRiRW, FAPA, ARiMR	2 234 197 603	55 785 258	69,2%
	2	MRiRW, FAPA, ARiMR, Urz. Marszał.	568 823 995	23 184 883	45,6%
	3	MRiRW, ARiMR	24 992 549	590 146	36,4%
	OGÓLEM			2 828 014 148	79 560 289
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	1	MRiRW, ARiMR	243 868 906	652 404	88,3%
	2	MRiRW, ARiMR	393 935	20 003	1,6%
	3	MRiRW, ARiMR	50 361 710	1 681 393	14,4%
	4	MRiRW, ARiMR	38 408 610	626 957	34,8%
	5	MRiRW, ARiMR	112 018	0	1,2%
	OGÓLEM			333 145 179	2 980 758

³ Wartość płatności w danym miesiącu stanowi różnicę wartości płatności na koniec danego miesiąca i wartości płatności na koniec miesiąca poprzedniego


Programy operacyjne	Priorytet	Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie	Wartość dokonanych płatności od uruchomienia programu (PLN)	Wartość dokonanych płatności w SIERPNIU 2007 r. (PLN) ³	Wartość dokonanych płatności od uruchomienia programu jako % realizacji zobowiązań na 2004 - 2006
Pomoc Techniczna	1	MRR	18 606 311	148 709	56,1%
	2	MF	14 153 423	1 035 884	33,0%
	3	MRR	15 758 130	495	49,5%
	OGÓŁEM			48 517 863	1 185 087
Programy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	OGÓŁEM	MRR, KSW	224 303 632	19 063 241	44,0%
Programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia	MRR, wojew.	30 425 619	292 923	26,7%
	Polska-Brandenburgia	MRR, wojew.	41 554 507	1 761 097	36,3%
	Polska-Saksonia	MRR, wojew.	29 658 077	115 708	29,3%
	Polska - Słowacja	MRR, wojew.	26 902 930	1 934 015	67,2%
	Polska - Czechy	MRR, wojew.	33 992 099	739 758	49,6%
	Polska - Litwa - Rosja	MRR, wojew.	14 824 975	3 898 712	16,1%
	Polska - Białoruś - Ukraina	MRR, wojew.	67 773 087	2 814 746	47,0%
	OGÓŁEM			245 131 294	11 556 960
OGÓŁEM			17 772 061 556	983 046 556	54,3%

Źródło: opracowanie własne.

Poniższy wykres, który na podstawie dynamiki miesięcznych płatności w okresie od stycznia do sierpnia 2007 r. przedstawia szacunkowy poziom płatności na koniec listopada 2007 r.⁴, jest prognostycznym uzupełnieniem zaprezentowanych w tabeli danych.

⁴ Przyjęto założenie, iż ostateczny termin poniesienia wydatku z konta programowego umożliwiające certyfikowanie go do Komisji Europejskiej przed końcem 2007 r. to koniec listopada 2007 r.

Wykres 3. Wartość dokonanych płatności od uruchomienia programu na koniec SIERPNIĄ br. jako % realizacji zobowiązań na lata 2004-06 oraz szacunkowa wartość płatności na koniec LISTOPADA br.

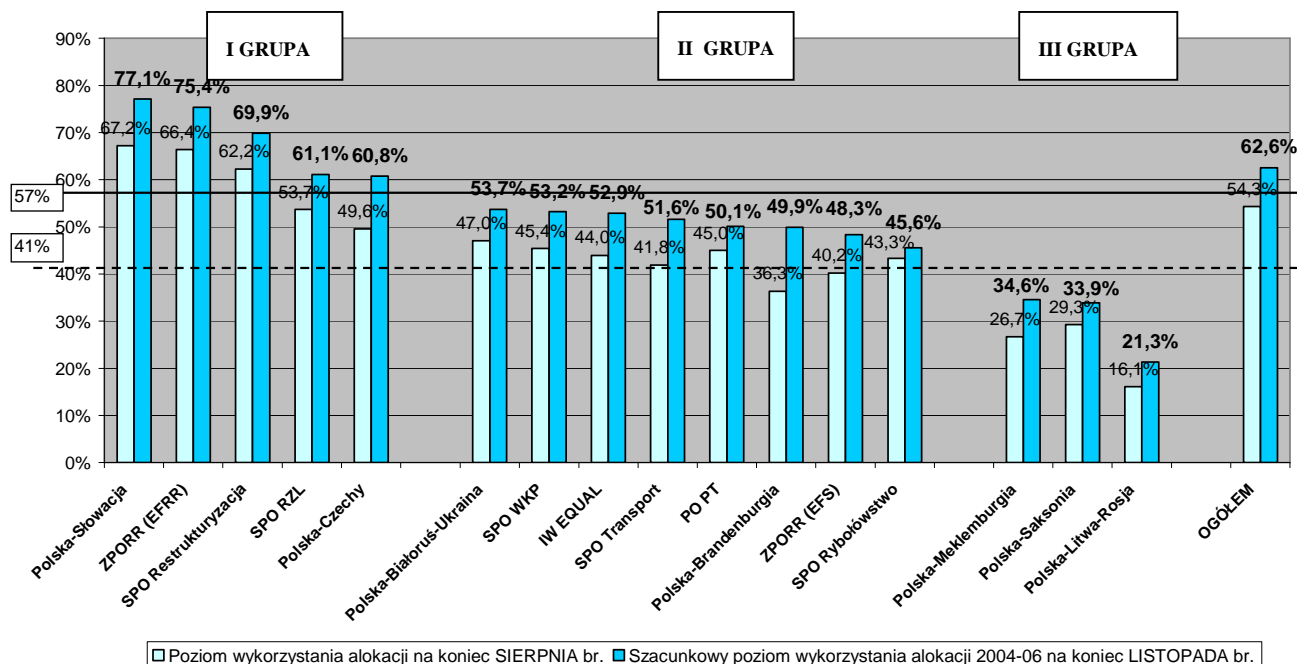

Biorąc zatem pod uwagę aktualny poziom płatności oraz szacowany poziom płatności na koniec listopada 2007 r. wynikający ze średniomiesięcznych płatności w 2007 r., programy operacyjne można podzielić na **trzy grupy**.

Do **pierwszej grupy** należą programy, w których poziom płatności z kont programowych na koniec listopada 2007 r. z dużym prawdopodobieństwem przekroczy (lub już przekroczył) 57% alokacji na lata 2004 – 2006. Te programy to:

- *Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego* (część współfinansowana z EFRR, tj. priorytety 1, 3, 4),
- *SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich*,
- *SPO Rozwój zasobów ludzkich*
- oraz dwa programy realizowane w ramach IW INTERREG III A:
 - ✓ *Polska – Słowacja*,
 - ✓ *Polska – Czechy*.

Do **drugiej grupy** zaliczają się programy, w których poziom płatności z kont programowych na koniec listopada 2007 r. zapewne przekroczy (lub już przekroczył) 41% całej alokacji umożliwiając w ten sposób wysłanie do KE wniosków o refundacje o wartości wystarczającej by spełnić zobowiązania wymagane w kontekście zasady n+2. Te programy to:

- *SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw*,
- *IW EQUAL*,
- *SPO Transport*,
- *PO Pomoc techniczna*,

- *Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego* (część współfinansowana z EFS, tj. priorytet 2),
- *SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb* (w przypadku tego programu bardzo niepokojące jest jednak występowanie dużych dysproporcji w poszczególnych priorytetach - bardzo wysoki poziom płatności w priorytecie 1 i bardzo niski w priorytetach 2, 3 i 5 - co może skutkować utratą części środków w końcowym okresie rozliczenia programu),
- oraz dwa programy realizowane w ramach IW INTERREG III A:
 - ✓ *Polska – Brandenburgia*,⁵
 - ✓ *Polska – Białoruś – Ukraina*.

W **trzeciej grupie** znajdują się programy, dla których, biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo płatności, poziom płatności na koniec listopada 2007 r. może nie przekroczyć minimalnego poziomu umożliwiającego certyfikowanie do KE wydatków wymaganych w kontekście zasady n+2. W tej grupie znajdują się trzy programy IW INTERREG III A:

- ✓ *Polska – Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia*,⁶
- ✓ *Polska – Saksonia*,
- ✓ *Polska – Litwa – Rosja*.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku IW INTERREG IIIA każdy program dysponuje jednym, wspólnym dla strony polskiej i partnerów zagranicznych, kontem programowym EFRR. W związku z tym, ewentualne anulowanie zobowiązań finansowych w wyniku zastosowania zasady n+2 dotyczy całości budżetu danego programu. Z tego wynika, iż w przypadku, gdy poziom wydatkowania środków w ramach polskiej części alokacji nie osiągnie wymaganego minimalnego poziomu, a bilans w ramach całego budżetu programu ten poziom przekroczy, nie nastąpi anulowanie zobowiązań w ramach polskiej części alokacji.

B. Analiza realizacji zobowiązań w kontekście zasady N + 2 wg instytucji⁷

Poniższa tabela prezentuje instytucje bezpośrednio odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych programów operacyjnych i priorytetów oraz poziom płatności wg stanu na koniec sierpnia 2007 r.

⁵ Dla programu *Polska – Brandenburgia* minimalny poziom wydatków niezbędnych do certyfikowania do KE w 2007 r. wynosi ok. 60%.

⁶ Dla programów *Polska – Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia* oraz *Polska – Saksonia* minimalny poziom wydatków niezbędnych do certyfikowania do KE w 2007 r. wynosi ok. 60%.

⁷ Lista instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie nie obejmuje instytucji wdrażających szczebla regionalnego, takich jak urzędy marszałkowskie czy wojewódzkie urzędy pracy.

Tabela 3. Wartość płatności z funduszy strukturalnych od uruchomienia programu (stan na koniec sierpnia 2007 r.) jako % zobowiązań KE na cały okres programowania wg instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za wdrażanie

Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie	Programy operacyjne	Działania	Wartość dokonanych płatności od uruchomienia programu (PLN)	Wartość dokonanych płatności w SIERPNIU 2007 r. (PLN) ⁸	Wartość dokonanych płatności od uruchomienia programu jako % realizacji zobowiązań na 2004 - 2006 (stan na SIERPIEŃ 2007 r.)
Minister Transportu*	SPO Transport	cały program	1 854 645 825	196 336 527	41,8%
Minister Gospodarki	SPO WKP	2.2, 1.1.1	294 890 057	18 395 290	57,5%
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	SPO WKP	1.4, 1.5	204 847 575	11 046 509	31,4%
Minister Edukacji Narodowej	SPO RZL	2.1, 2.2	853 244 735	6 500 671	41,0%
Minister Pracy i Polityki Społecznej	SPO RZL	1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3	403 639 891	49 545 218	41,0%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	SPO RZL	2.4	12 975 561	1 929 511	68,1%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego**	Pomoc techniczna	cały program	48 517 863	1 185 087	45,0%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	SPO WKP	2.4	125 109 601	17 898 497	22,2%
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	SPO WKP	1.1.2, 1.2, 2.1, 2.2.1, 2.3	1 554 576 818	98 014 807	49,5%
	SPO RZL	2.3			
Agencja Rozwoju Przemysłu	SPO WKP	1.3	218 124 170	396 129	40,1%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	SPO RZL	1.4	175 476 764	20 344 179	60,3%
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa***	SPO Rybołówstwo	Priorytet 1 - 4	3 161 047 308	82 541 046	59,6%
	SPO Restrukturyzacja	cały program			

Źródło: opracowanie własne

* Ministerstwo Transportu pełni rolę instytucji pośredniczącej, jednakże bezpośrednio odpowiada za wdrażanie SPO Transport

** Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni rolę instytucji zarządzającej dla PO Pomoc techniczna

*** ARMiR nie jest instytucją wdrażającą dla wszystkich działań w SPO Restrukturyzacja..., jednakże jest odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów dla całego programu.

Wśród ministerstw najniższy poziom wykorzystania alokacji 2004 – 2006 występuje w przypadku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - odpowiedzialnego za wdrażanie działań 1.4 i 1.5 SPO WKP, które wydatkowało 31,4% alokacji, Ministerstwa Pracy i Polityki

⁸ Wartość płatności w danym miesiącu stanowi różnicę wartości płatności na koniec danego miesiąca i wartości płatności na koniec miesiąca poprzedniego

Społecznej (działania 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3 SPO RZL) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wydatkowały 41% z przypadającej na nie alokacji na lata 2004 – 2006.

Wśród agencji i funduszy celowych, zaangażowanych we wdrażanie poszczególnych działań, najniższy poziom wydatkowania środków wspólnotowych ma miejsce w przypadku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (działanie 2.4 SPO WKP), który do końca sierpnia 2007 r. zdołał wydatkować ok. 125 mln zł z ponad 560 mln zł alokacji na lata 2004 – 2006, tj. 22,2 % alokacji.

C. Postęp finansowy w 2007 r.

Poniższe tabele przedstawiają postęp finansowy w poszczególnych miesiącach 2007 r., poziom średniomiesięcznej płatności w 2007 r. oraz poziom średniomiesięcznych płatności niezbędny, aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji środków finansowych na lata 2004-06.

Tabela 4. Zestawienie miesięcznych płatności w ramach programów (od marca do sierpnia 2007 r.)⁹

PROGRAM OPERACYJNY		Płatności w MARCU 2007 r.	Płatności w KWIETNIU 2007 r.	Płatności w MAJU 2007 r.	Płatności w CZERWCU 2007 r.	Płatności w LIPCU 2007 r.	Płatności w SIERPNIU 2007 r.
SPO WKP		155 441 413	121 431 640	133 437 071	128 458 756	91 744 737	98 825 279
ZPORR	ERDF	237 232 777	327 915 008	285 851 774	328 546 779	342 359 268	312 401 776
	ESF	28 575 114	48 539 962	52 494 851	47 472 097	51 759 158	62 822 870
	OGÓŁEM	265 807 891	376 454 970	338 346 625	376 018 876	394 118 426	375 224 646
SPO Transport		113 900 125	69 423 760	191 178 038	196 493 791	201 108 080	196 336 527
SPO RZL		82 742 348	88 744 068	190 468 328	103 477 450	160 695 278	198 313 770
SPO Restrukturyzacja		173 655 210	136 998 115	136 682 272	77 394 340	94 498 145	79 560 288
SPO Rybołówstwo		10 488 458	2 359 878	4 514 291	6 068 835	15 101 259	2 980 758
PO PT		4 337 591	875 560	318 406	4 184 034	690 658	1 185 087
IW EQUAL		30 723 254	2 443 343	29 259 621	7 210 832	20 077 435	19 063 241
IW INTERREG	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie	0	501 697	834 769	7 921 511	11 138 272	292 923
	Polska-Brandenburgia	8 760 782	141 274	0	5 249 102	0	1 761 097
	Polska-Saksonia	4 058 307	1 152 140	98 977	7 051 142	6 711	115 708
	Polska-Słowacja	2 504 609	1 052 603	2 103 886	906 323	389 081	1 934 015
	Polska-Czechy	1 819 986	1 650 248	2 120 779	5 301 354	3 810 539	739 757
	Polska-Litwa-Rosja	991 599	3 234 115	1 332 231	2 686 455	705 345	3 898 713
	Polska-Białoruś-Ukraina	3 237 544	3 059 851	5 848 885	3 738 364	456 210	2 814 746
	OGÓŁEM	21 372 827	10 791 929	12 339 526	32 854 251	16 506 157	11 556 960
OGÓŁEM		858 469 116	809 523 263	1 036 544 177	932 161 167	994 540 174	983 046 557

Przeciętna miesięczna płatność w ramach PWW w 2007 r. na koniec sierpnia 2007 r. wynosi ponad **898 mln zł** (wobec 887 mln zł w lipcu 2007 r.) i **pomimo mniejszej płatności w sierpniu 2007 r. w stosunku do lipca 2007 r. wykazuje stabilną tendencję wzrostową.**

⁹ Wartość płatności w danym miesiącu stanowi różnicę wartości płatności na koniec danego miesiąca i wartości płatności na koniec miesiąca poprzedniego.

Tabela 5. Poziom średniomiesięcznych płatności niezbędny, aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na lata 2004-06

PROGRAM OPERACYJNY		Średniomiesięczna płatność w 2007 r. (styczeń – sierpień 2007 r.)	Środki jakie pozostały do wydatkowania do końca 2008 r.	Średniomiesięczna płatności potrzebna aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na 2004-06
SPO WKP		123 967 961	2 601 564 495	162 597 781
ZPORR	ERDF	289 581 912	3 242 129 223	202 633 076
	ESF	45 065 332	998 651 988	62 415 749
	OGÓLEM	334 647 243	4 240 781 211	265 048 826
SPO Transport		144 107 885	2 577 383 632	161 086 477
SPO RZL		138 691 035	2 594 459 997	162 153 750
SPO Restrukturyzacja		115 425 172	1 715 654 774	107 228 423
SPO Rybołówstwo		5 785 698	435 754 252	27 234 641
PO PT		1 834 367	59 310 827	3 706 927
IW EQUAL		15 149 773	285 947 357	17 871 710
IW INTERREG	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie	3 002 830	83 644 967	5 227 810
	Polska-Brandenburgia	5 194 313	72 917 386	4 557 337
	Polska-Saksonia	1 572 314	71 717 360	4 482 335
	Polska-Słowacja	1 313 653	13 104 419	819 026
	Polska-Czechy	2 565 862	34 591 928	2 161 996
	Polska-Litwa-Rosja	1 604 906	77 220 660	4 826 291
	Polska-Białoruś-Ukraina	3 213 625	76 301 680	4 768 855
	OGÓLEM	18 467 503	429 498 400	26 843 650
OGÓLEM		898 076 637	14 940 354 946	933 772 184

Średniomiesięczna płatność w 2007 r. (od stycznia do sierpnia 2007 r.) wynosi ponad **898 mln zł**. Natomiast średniomiesięczna płatność, niezbędna aby do końca 2008 r. wykorzystać 100% alokacji na 2004 – 2006, wynosi ok. **933 mln zł**. Tak więc w celu wykorzystania 100% alokacji niezbędne jest zwiększenie średniomiesięcznych płatności o ok. 35 mln zł (przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększenia wydatkowania w programach, w których obecny poziom płatności jest niższy od wymaganego dla realizacji zobowiązań do końca 2008 r.).

D. Realizacja prognozy wydatkowania NPR 2004-2006 w roku 2007 w oparciu o dane wg stanu na koniec sierpnia 2007 r. wg programów operacyjnych

Prognoza wydatków z funduszy strukturalnych w 2007 r., przyjęta przez Radę Ministrów, zakłada wydatkowanie kwoty ponad 16 mld zł.

Wg stanu na koniec sierpnia 2007 r., w skali wszystkich programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004 – 2006 w 2007 r., wydatkowano ponad 7 184 mln zł. W samym sierpniu 2007 r. wydatkowano ok. 983 mln zł, czyli mniej o ok. 18 mln niż w lipcu 2007 r. i wciąż niewystarczająco dla osiągnięcia

zadowalającego poziomu realizacji prognozy. W skali wszystkich programów operacyjnych stopień realizacji prognozy wyniósł 44,8%. By w pełni zrealizować prognozę, średniomiesięczna płatność z kont programowych do końca roku powinna wynosić ponad 2,2 mld zł w skali wszystkich programów.

Stopień realizacji prognozy w poszczególnych programach operacyjnych oraz w wybranych instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie, wg stanu na koniec sierpnia 2007 r., przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 6. Realizacja prognozy wydatków z funduszy strukturalnych w 2007 r. w programach operacyjnych (wg stanu na koniec sierpnia 2007 r.)

PROGRAM OPERACYJNY		Wartość płatności w 2007 r. (PLN)	Prognoza na 2007 r. (PLN)	Płatności w SIERPNIU 2007 r. (PLN) ¹⁰	% realizacji prognozy
SPO WKP		991 743 685	2 545 317 683	98 825 279	39,0%
ZPORR	ERDF	2 316 655 293	4 462 289 243	312 401 776	51,9%
	ESF	360 522 654	955 519 885	62 822 870	37,7%
	OGÓŁEM	2 677 177 947	5 417 809 128	375 224 646	49,4%
SPO Transport		1 152 863 081	2 499 536 490	196 336 527	46,1%
SPO RZL		1 109 528 279	2 643 409 530	198 313 770	42,0%
SPO Restrukturyzacja		923 401 373	1 873 202 618	79 560 288	49,3%
SPO Rybołówstwo		46 285 585	306 112 747	2 980 758	15,1%
PO PT		14 674 935	38 119 446	1 185 087	38,5%
IW EQUAL		121 198 186	269 463 005	19 063 241	45,0%
IW INTERREG	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia	24 022 644	79 467 412	292 923	30,2%
	Polska-Brandenburgia	41 554 507	98 848 353	1 761 097	42,0%
	Polska-Saksonia	12 578 512	67 537 785	115 708	18,6%
	Polska-Słowacja	10 509 221	17 466 400	1 934 015	60,2%
	Polska-Czechy	20 526 893	38 532 057	739 757	53,3%
	Polska-Litwa-Rosja (obwód kaliningradzki)	12 839 246	63 320 573	3 898 713	20,3%
	Polska-Białoruś-Ukraina	25 708 999	64 429 002	2 814 746	39,9%
	OGÓŁEM	147 740 021	429 601 582	11 556 960	34,4%
OGÓŁEM		7 184 613 092	16 022 572 228	983 046 557	44,8%

Źródło: opracowanie własne

Wysoki stopień realizacji prognozy osiągnięto w dwóch programach IW INTERREG IIIA-*Polska-Słowacja* (60,2%), *Polska – Czechy* (53,3%). Spośród programów operacyjnych najwyższy stopień realizacji prognozy występuje w przypadku *SPO Restrukturyzacja...* (49,3%) oraz *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego* (49,4%). Najniższy stopień realizacji prognozy ma miejsce w ramach *SPO Rybołówstwo...* (15,1%) oraz w ramach 2 programów IW INTERREG IIIA: *Polska-Litwa-Rosja* (20,3%) i *Polska-Saksonia* (18,6%).

¹⁰ Wartość płatności w danym miesiącu stanowi różnicę wartości płatności na koniec danego miesiąca i wartości płatności na koniec miesiąca poprzedniego.

E. Realizacja prognozy wydatkowania NPR 2004-2006 w 2007 roku na koniec sierpnia 2007 r. wg instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie

Tabela 7. Realizacja prognozy wydatków z funduszy strukturalnych w 2007 r. w wybranych instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie (wg stanu na koniec sierpnia 2007 r.)


Institucja	Program operacyjny	Działania	Prognoza na 2007 r. (PLN)	Płatności w SIERPNIU 2007 r. (PLN) ¹¹	Płatności w 2007 r. (PLN)	% realizacji prognozy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	SPO RZL	1.4	139 730 036	20 344 179	81 124 105	58,1%
Kancelaria Prezesa RM	SPO RZL	2.4	13 807 844	1 929 511	7 691 668	55,7%
Ministerstwo Gospodarki	SPO WKP	2.2, 1.1.1	321 868 737	18 395 290	151 518 342	47,1%
Ministerstwo Transportu	SPO Transport	cały program	2 499 536 490	196 336 527	1 152 863 081	46,1%
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	SPO Rybołówstwo / SPO Restrukturyzacja	priorytet 1 - 4 / cały program	2 173 259 773	82 541 046	969 686 958	44,6%
Agencja Rozwoju Przemysłu	SPO WKP	1.3	337 920 640	396 129	135 193 226	40,0%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	PO PT	cały program	38 119 446	1 185 087	14 674 935	38,5%
Ministerstwo Edukacji Narodowej	SPO RZL	2.1, 2.2	768 943 696	6 500 671	289 549 899	37,7%
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	SPO WKP / SPO RZL	1.1.2, 1.2, 2.1, 2.2.1, 2.3 / 2.3	1 643 184 174	98 014 807	565 145 976	34,4%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	SPO RZL	1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3	728 489 012	49 545 218	228 408 764	31,4%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	SPO WKP	2.4	335 000 000	17 898 497	103 952 461	31,0%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	SPO WKP	1.4, 1.5	435 037 672	11 046 509	132 609 060	30,5%

Spośród monitorowanych instytucji, najwyższy stopień realizacji prognozy osiągnął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (58,1%), Kancelaria Prezesa RM (55,7%) oraz Ministerstwo Gospodarki (47,1%). Najniższy poziom realizacji prognozy ma miejsce w przypadku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (31,4%), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (31%) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (30,5%).

Graficznym uzupełnieniem danych prezentowanych w tabeli jest poniższy wykres.

¹¹ Wartość płatności w danym miesiącu stanowi różnicę wartości płatności na koniec danego miesiąca i wartości płatności na koniec miesiąca poprzedniego.

Realizacja prognozy wydatków z funduszy strukturalnych w 2007 r. wg instytucji

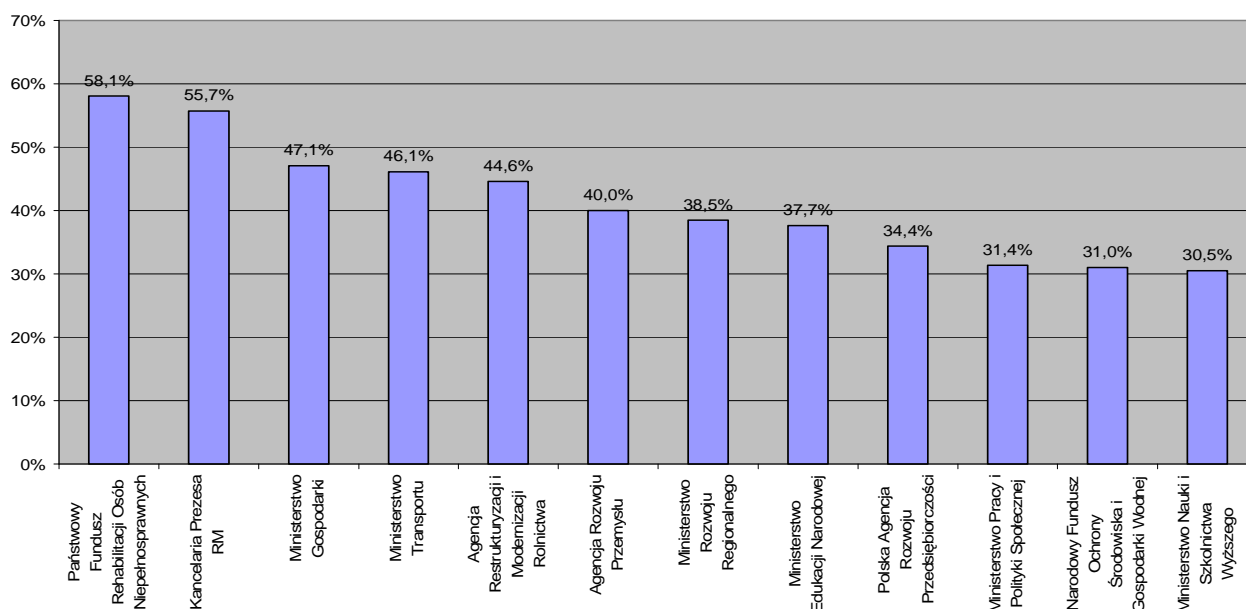

III. Najważniejsze problemy we wdrażaniu wybranych programów operacyjnych

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w sierpniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach*	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji*	Dalsze zalecenia
SPO Rybolówstwo i przetwórstwo ryb					
Utrzymujący się niski poziom kontraktacji środków (86,5% alokacji).	<p>Pozyskanie kolejnych projektów i zakontraktowanie środków.</p> <p>Kontynuacja działań zwiększających poziom kontraktacji środków.</p>	ARiMR / MRiR W	Działanie ciągłe	W sierpniu 2007 r. podpisano 53 umowy o dofinansowanie o wartości ok. 14,2 mln zł w części dofinansowania wspólnotowego. Wartość umów zawartych z beneficjentami wzrosła w sierpniu 2007 r. o ponad 1 punkt procentowy (do poziomu 87,7% alokacji).	Prowadzenie dalszych działań zwiększających poziom kontraktacji środków.

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w sierpniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach*	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji*	Dalsze zalecenia
<p>Utrzymujący się w kolejnych miesiącach niski poziom płatności w ramach większości działań (poza priorytetem 1 i komplementarnym do niego działaniem 4.2), skutkujący m.in. niskim poziomem realizacji prognozy RM.</p>	<p>Przyspieszenie procesu realizacji projektów i ich rozliczania</p>	<p>ARiMR / MRiRW</p>	<p>Działanie ciągłe</p>	<p>W dn. 20 sierpnia 2007 r. opublikowano w Monitorze Polskim komunikat MRiRW o nowych wzorach umów o dofinansowanie. Zapisy przedmiotowych umów zmieniono w celu umożliwienia dzielenia projektów na etapy, a tym samym wielokrotnego wnioskowania o płatności pośrednie.</p> <p>Wartość refundacji na rzecz beneficjentów w ramach całego programu wzrosła w sierpniu 2007 r. jedynie o niespełna 0,1 punktu procentowego (z poziomu 43,25% alokacji odnotowanego na koniec lipca 2007 r. do poziomu 43,33% odnotowanego na koniec sierpnia 2007 r.).</p>	<p>Realizacja przez MRiRW zaleceń MRR dotyczących uproszczenia systemu rozliczeń oraz ułatwiających dostęp do pomocy.</p>
<p>Brak zdolności instytucjonalnej Instytucji Zarządzającej dla SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb.</p>	<p>Zwiększenie zatrudnienia w IZ oraz wprowadzenie systemu motywacyjnego pracowników, a także powołanie Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW odpowiedzialnego za realizację SPO Rybołówstwo...</p> <p>MRiRW powinno przedstawić obecną strukturę organizacyjną IZ.</p>	<p>MRiRW</p>	<p>Niezwłocznie</p>	<p>Nadal brak jest zastępcy dyrektora nadzorującego prace wydziałów odpowiedzialnych za wdrażanie Programu. Ponadto, w sierpniu nie zwiększono zatrudnienia w IZ.</p>	<p>Realizacja zaleceń przedstawionych w lipcu 2007 r., tj. powołanie Zastępcy Dyrektora DROW, zwiększenie motywacji pracowników oraz wzmocnienie kadrowe IZ.</p>

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w sierpniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach*	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji*	Dalsze zalecenia
SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw					
<p>Działanie 1.5 – utrzymujący się niski poziom płatności (16% alokacji według stanu na koniec lipca 2007 r.)</p>	<p>Kontynuacja bieżącego monitorowania projektów oraz współpracy z beneficjentami w celu systematycznego wnioskowania przez nich o refundację.</p> <p>Podpisanie przez MSWiA stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu MSWiA „Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych”.</p> <p>W przypadku dalszych problemów z realizacją projektu PESEL2 rozważenie możliwości przesunięcia środków do działania 1.4.</p>	<p>MNiS W</p> <p>MSWiA</p>	<p>Działanie ciągłe</p> <p>Zawarcie aneksu do umowy przez MSWiA – najpóźniej do połowy września 2007 r.</p>	<p>Instytucja realizuje zalecenia w sposób ciągły.</p> <p>Według stanu na 31.08.2007 r. poziom płatności w działaniu 1.5 wyniósł 20% alokacji)*</p> <p>*w sierpniu 2007 r. wypłacono niespełna 1,6 mln zł; wzrost wykorzystania alokacji jest wynikiem realokacji środków o wartości 15,9 mln euro (w części EFRR) z działania 1.5</p> <p>Do końca sierpnia 2007 r. nie został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu MSWiA.</p> <p>Kolejne opóźnienia w realizacji projektu MSWiA „Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych” (PESEL2).</p>	<p>Realizacja zaleceń przedstawionych w lipcu 2007 r.</p> <p>Realizacja zaleceń przedstawionych w lipcu 2007 r.</p>
<p>Niski poziom płatności w działaniu 2.4 (19% alokacji wg stanu na koniec lipca 2007 r.)</p>	<p>Kontynuacja bieżącej współpracy właściwych instytucji z beneficjentami w celu zapewnienia sprawnej realizacji i systematycznego rozliczenia projektów.</p>	<p>MS/ NFOŚi GW</p>	<p>Działanie ciągłe</p>	<p>Instytucje realizują zalecenia w sposób ciągły.</p> <p>Według stanu na 31.08.2007 poziom płatności w działaniu wyniósł 22% alokacji.</p>	<p>Realizacja zaleceń przedstawionych w lipcu 2007 r.</p>

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w sierpniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach*	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji*	Dalsze zalecenia
SPO Transport					
<p>Niski poziom płatności w programie - 37,7% dostępnej alokacji i 38,2% realizacji prognozy na 2007 r. (wg stanu na koniec lipca 2007 r.)</p>	<p>Zapewnienie stałego monitoringu projektów poprzez regularną współpracę pracowników Instytucji Pośredniczącej z beneficjentami oraz poprzez mobilizowanie ich do systematycznego wnioskowania o refundację.</p> <p>W celu realizacji prognozy płatności na 2007 r. - utrzymanie w kolejnych miesiącach wysokiego tempa refundacji wydatków ponoszonych przez beneficjentów.</p>	MT	W sposób ciągły	<p>W sierpniu 2007 r. zanotowano wysoki poziom płatności z konta programowego (ok. 196 mln zł). Według stanu na koniec sierpnia 2007 r. płatności dokonane na rzecz beneficjentów osiągnęły poziom 41,9% dostępnej alokacji i 46,1% realizacji prognozy na 2007 r.</p>	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji
<p>Niski poziom kontraktacji (wg stanu na koniec lipca 2007 r. – 37,7% alokacji) oraz brak płatności w działaniu 1.3</p>	<p>MT podpisało jak dotąd 1 umowę o dofinansowanie w ramach działania 1.3 na realizację projektu SPOT/1.3.1/141/05 (30 marca 2007r.).</p> <p>Jak najszybsze przeprowadzenie planowanego przez MT naboru w ramach działania 1.3 i podpisanie umów o dofinansowanie realizacji kolejnych projektów</p> <p>Konieczne jest pilne zawarcie umów o dofinansowanie realizacji kolejnych projektów:</p> <p>- SPOT/1.3.1/167/05 (zawarcie umowy uzależnione jest od przekazania przez beneficjenta</p>	MT	Lipiec 2007 r.	<p>W sierpniu 2007 r. nie podpisano żadnej nowej umowy o dofinansowanie.</p> <p>W przypadku projektu SPOT/1.3.2/170/05 Minister Transportu wyraził zgodę na zwiększenie wartości projektu, w związku z czym beneficjent przekazał skorygowany wniosek o dofinansowanie.</p> <p>Ponadto, 27 sierpnia 2007 r. otwarty został ponowny nabór projektów w ramach tego działania, który potrwa do 24 września 2007 r.</p>	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w sierpniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach*	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji*	Dalsze zalecenia
	zaktualizowanego pozwolenia na budowę), - SPOT/1.3.2/170/05				
Niski poziom płatności w ramach priorytetu 3 Pomoc techniczna (wg stanu na koniec lipca 2007 r. - 16,3% alokacji)	Przyjęcie kolejnych projektów do realizacji w ramach PT. Przyspieszenie tempa realizacji projektów w ramach PT oraz zapewnienie sprawnego rozliczania tych projektów	MT, MRR	Jak najszybciej	W dalszym ciągu zbyt wolne tempo rozliczania projektów – poziom płatności na koniec sierpnia 2007 r. wyniósł zaledwie 19,5% dostępnej dla tego priorytetu alokacji. Szczególnie niepokojący jest brak postępów w realizacji działania 3.2 (4,5% dostępnej alokacji)	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji
Brak decyzji Komisji Europejskiej o potwierdzeniu dofinansowania dla 2 dużych projektów, co może skutkować trudnościami w realizacji prognozy płatności na 2007 r.:	Monitoring projektów zarówno przez IZ (w relacjach z KE) jak i przez IPZ w relacjach z beneficjentami	MRR i MT	W trybie ciągłym	W dalszym ciągu brak decyzji Komisji Europejskiej o potwierdzeniu dofinansowania dla tych projektów	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji
• „Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg-Grzechotki”	Podjęcie intensywnej współpracy MRR, MT, MŚ oraz GDDKiA w celu znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego zarówno stronę polską jak i KE			31 sierpnia 2007 r. przekazano KE projekt dodatkowych kompensacji zgodny z wymogami KE	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji
• „Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego Młociny”	Monitoring projektu zarówno przez IZ (w relacjach z KE) jak i przez IPZ w relacjach z beneficjentem			23 lipca 2007 r. beneficjent przesłał KE dodatkowe dokumenty do złożonego 11 czerwca 2007 r. wniosku o potwierdzenie wysokości współfinansowania	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w sierpniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach*	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji*	Dalsze zalecenia
<i>Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego</i>					
Wolne tempo rozliczeń w działaniach 2.3 – 2.6 – szczególnie niski poziom płatności w działaniu 2.6.	Wzmocnienie kadrowe instytucji odpowiedzialnych za rozliczanie w/w działań w regionach Podjęcie działań na rzecz przyspieszenia tempa realizacji i rozliczenia projektów z działania 2.6.	UW/samorządy	Niezwłocznie	We wszystkich działaniach widoczny jest postęp w wydatkowaniu środków. Niemniej jednak wskaźnik płatności w działaniu 2.6 jest na poziomie 23,4% alokacji.	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji
<i>SPO Rozwój zasobów ludzkich</i>					
Niski poziom płatności w działaniu 1.6 – 29,4% alokacji oraz w działaniu 1.1 – 35,9% alokacji, przy średniej dla priorytetu ok. 63%.	Zapewnienie stabilności kadr oraz utworzenie kompleksowego i trwałego systemu motywacyjnego pracowników.	MPiPS	W trybie ciągłym	Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu okresowym, stwierdzić można iż sytuacja kadrowa uległa znacznej poprawie (69 etatów obsadzonych na 85 przyznanach).	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji
	Przyspieszenie procesu rozliczeń finansowych, a także realizacji projektów, dla których beneficjentami są departamenty merytoryczne MPiPS. Zintensyfikowanie prac w odpowiednich departamentach MPiPS odpowiedzialnych za wdrażanie SPO RZL tak, by przełożyły się one na zwiększenie poziomu płatności.	MPiPS	Niezwłocznie	W działaniach 1.1 i 1.6 powołano grupy robocze, których działalność już przyniosła wymierne efekty w postaci wzrostu poziomu płatności w sierpniu 2007 r. w porównaniu z lipcem 2007 r. (dla działania 1.1 jest to wzrost o ok. 6,5 punktu procentowego, zaś dla działania 1.6- o ok. 3,3 punktu procentowego). Do obsługi wniosków o płatność zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie.	Kontynuacja realizacji zaleceń z poprzednich informacji

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w sierpniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach*	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji*	Dalsze zalecenia
IW Interreg					
Niskie płatności w programie Polska – Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia (wg stanu na koniec lipca 2007 r. - 26,6% alokacji)	Wzmocnienie kadrowe komórek UW odpowiedzialnych za realizację programu, w tym w szczególności komórek zajmujących się przygotowaniem umów i rozliczeniami finansowymi. Utrzymanie dotychczasowego tempa rozliczeń w celu uniknięcia zagrożeń wynikających z zasady N+2	MRR/ UW	Niezwłocznie	Po widocznym wzroście płatności w lipcu 2007 r. (o ok. 10 punktów proc. w porównaniu z czerwcem 2007 r.) w programie meklemburskim, w sierpniu 2007 r. poziom refundacji w ramach tego programu nie przekroczył 1 punktu proc.	Przyspieszenie tempa rozliczeń w celu uniknięcia zagrożeń wynikających z zasady N+2
Niskie płatności w programie Polska-Brandenburgia (wg stanu na koniec lipca 2007 r. - 35% alokacji) oraz Polska-Saksonia (wg stanu na koniec lipca 2007 r. – 29,3 % alokacji)		MRR/ UW	Niezwłocznie	W programach: saksońskim i brandenburskim nie ma postępu w wypłacaniu środków od czerwca 2007 r.	Przyspieszenie tempa rozliczeń w celu uniknięcia zagrożeń wynikających z zasady N+2

Najważniejsze problemy w realizacji programu przedstawione w poprzednich informacjach*, nowe problemy zidentyfikowane w sierpniu 2007 r.	Propozycja działań z poprzednich informacji*	Instytucja odpowiedzialna	Termin realizacji określony w poprzednich informacjach*	Realizacja zaleceń z poprzednich informacji*	Dalsze zalecenia
<p>Niskie płatności i poziom kontraktacji w programie Polska – Litwa-Rosja (Obwód Kaliningradzki) – wg stanu na koniec lipca 2007 r. odpowiednio: 11,96% i 75,4%, a także bardzo niski poziom wnioskowanego wsparcia (wg stanu na koniec sierpnia 2007 r. - 87,4% alokacji).</p>	<p>j.w.</p> <p>Zakończenie kontraktacji w programie Polska-Litwa-Rosja (obwód Kaliningradzki), przyspieszenie procesu rozliczeń oraz pozyskanie kolejnych projektów.</p> <p>Niewzłoczne, przy udziale partnera litewskiego, dokonanie analizy przewidywanych płatności do końca 2007 r. oraz oszacowanie poziomu wydatków niezbędnych w skali całego programu dla realizacji zobowiązań wynikających z zasady n+2.</p>	<p>MRR/ UW</p> <p>UW</p>	<p>Niewzłocznie</p> <p>W trybie ciągłym</p>	<p>W programie wskaźnik płatności wzrósł na koniec sierpnia 2007 r. o ok. 4 punkty proc. (przy wzroście na koniec lipca 2007 r. o ok. 1 punkt proc.), co jednakże nie niweluje zagrożenia dla realizacji zobowiązań wynikających z zasady N+2.</p>	<p>Niezmiennie konieczne jest dokonanie analizy zalecanej w poprzedniej informacji.</p>

* Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE za okres od 1 do 31 lipca 2007 r. oraz za okresy wcześniejsze
